



वार्षिक समीक्षा

भौतिक पूर्वाधार र योजना शाखा

आ.व. २०८२/०८३

मिति: २०८३/०४/२१

प्रस्तुतकर्ता: काजीमान कुलुङ (स.इन्जिनियर)


प्रमुख कार्यक्षेत्र

- ग्रामीण सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति ।
- पुल तथा कल्भर्ट निर्माण ।
- प्रशासनिक तथा सार्वजनिक भवन निर्माण ।
- खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना
- सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वाधार ।
- सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत ।
- वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ।
- आयोजना अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन ।

सडक विस्तार अवलोकन

सारांश

आ.व. २०८१/८२ मा जम्मा
१४९.३५ कि.मि. सवारी सञ्चालन
योग्य कच्ची सडक थियो। यस वर्ष
१३.३११ कि.मि. थप भई ८.९१३%
वृद्धि भएको छ।

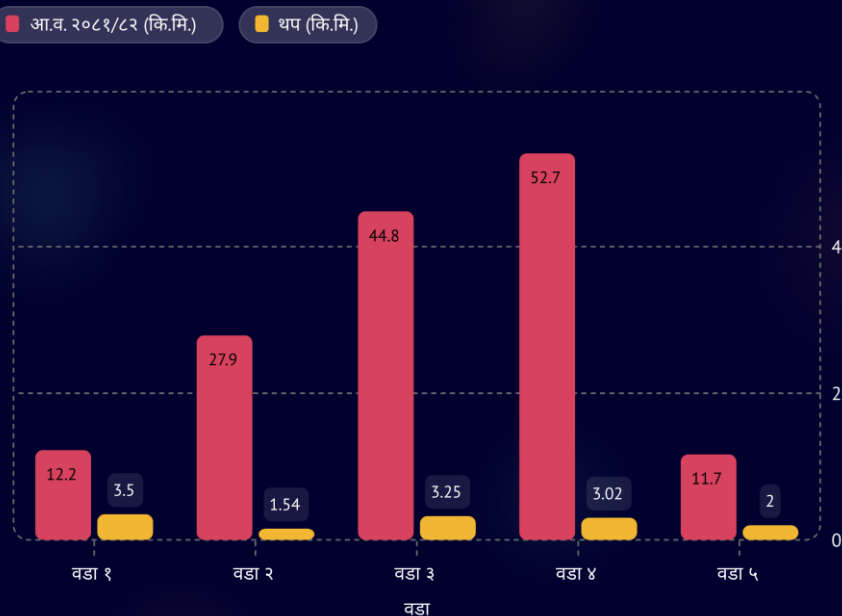

जम्मा सडक
१४९.३५ कि.मि.

थप सडक
१३.३११ कि.मि.

वृद्धि प्रतिशत
८.९१३%

आ.व. २०८२/०८३ सम्म अध्यावधिक
जम्मा: १६२.६६१ कि.मि.

बोलपत्रबाट सम्पन्न/सञ्चालित योजनाहरू

योजनाको नाम	वडा	विनियोजित बजेट (रु.)	स्थिति
बखलटुम बेलीब्रिज निर्माण	१ र २	३,५०,००,०००	निर्माणाधिन
बुधबारे कृषि बजार व्यवस्थापन (संघीय विशेष)	२	६८,००,०००	सम्पन्न
ताम्कू प्राथमिक अस्पताल ५ शैया (संघीय सम्पूरक)	३	४७,००,०००	निर्माणाधिन
५ नं. वडा कार्यालय भवन (प्रादेशिक सम्पूरक)	५	२७,००,०००	निर्माणाधिन
सिम्ले खाम्खु-तम्बे ट्रयाक ओपन	५	४५,००,०००	सम्पन्न

वेयुम्मा तेन्छोड सडक निर्माण योजना	१	२९,००,०००	निर्माण सम्पन्न
------------------------------------	---	-----------	-----------------

प्रशासकीय भवन निर्माण योजना	३	३०,००,०००	निर्माणाधिन गत आ.व.बाट
बेन्छोड निलगुफा, देउराली सडक निर्माण योजना	४	१४,००,०००	निर्माण सम्पन्न
माङ्तेवा सडक स्तरोन्नती योजना	४	११,००,०००	निर्माण सम्पन्न

४) मुख्य योजनाहरूको विवरण (बोलपत्र गरिएको)

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	बिनियोजित बजेट रु.	कैफियत
१.	बखलटुम बेलीब्रिज निर्माण योजना	१ र २	३,५०,००,०००।- सम्झौता रकम: ३,०२,९८,३७०।०७	निर्माणाधिन
२.	बुधबारे कृषि बजार व्यवस्थापन योजना	२	६८,००,०००।- सम्झौता रकम: ४९,४९,३४९।-	निर्माण सम्पन्न
३.	ताम्कू प्राथमिक अस्पताल ५ शैया भवन निर्माण योजना	३	४७,००,०००.०० सम्झौता रकम: ५,९९,७०,६७७।८६	निर्माणाधिन
४.	५ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण योजना	५	२७,००,०००।- सम्झौता रकम: १,२७,६७,८९५।०३	निर्माणाधिन
५.	सिम्ले खाम्खु देखि तम्बे ट्यूनाक ओपन निर्माण योजना	५	४५,००,०००।- सम्झौता रकम: २४,७८,३३८।२४	निर्माण सम्पन्न
५.	वेयुम्मा तेन्छोड सडक निर्माण योजना	१	२९,००,०००।- सम्झौता रकम; २८,५३,३४३।०४	निर्माण सम्पन्न
७.	प्रशासकीय भवन निर्माण योजना	३	३०,००,०००।- सम्झौता रकम; ७,९७,३७,५६०।५७	निर्माणाधिन
८.	बेन्छोड निलगुफा, देउराली सडक निर्माण योजना	४	१४,००,००० सम्झौता रकम; ८,९९,५०५।६२	निर्माण सम्पन्न
९.	माङ्तेवा सडक स्तरोन्नती योजना	४	११,००,००० सम्झौता रकम; ८,८८,५१८।३९	निर्माण सम्पन्न

सोझै खरिदबाट सम्पन्न योजनाहरू

वडा २ का योजनाहरू

- मुलगाउँ-लम्मुवा सडक – रु. ९,००,०००
- पेलुम्बाटार-रमिते सडक – रु. ९,००,०००
- पिखुवा-तल्लोटोल सडक – रु. ८,००,०००
- तेयुड माझगाउँ सडक – रु. ७,५०,०००
- माझगाउँ डडागाउँ सडक – रु. ७,००,०००
- पिखुवा ट्रसपुल – रु. ७,५०,०००

अन्य वडाका योजनाहरू

- भिमसेन तिवा सडक (वडा १) – रु. १०,००,०००
- सर्बोला दिवादेभान यांसिम्मा गोगने सडक (वडा १) – रु. १०,००,०००
- चित्रे पुनर्वासबाट बकाड जाने सडक (वडा १) – रु. १०,००,०००
- सिम्लादक सडक टर्निडमा ग्याबिन वाल (वडा ३) – रु. ६,००,०००
- कोल्वा-पावा सडक (वडा ३) – रु. ५,००,०००
- नागीटार लकुवा सडक (वडा ३) – रु. ८,००,०००
- बेन्द्रोड खेलमैदान (वडा ४) – रु. १०,००,०००



५) सोझै खरिदबाट सम्पन्न भएका योजनाहरू

क्र.सं.	योजनाको नाम	वडा नं.	विनियोजन रकम रु.	सम्झौता रकम रु.
१.	मुलगाउँ -लम्मुवा सडक निर्माण योजना	२	९,००,०००।-	८,८४,४६३।७४
२.	पेलुम्बाटार -रमिते सडक निर्माण योजना	२	९,००,०००।-	८,८४,६२७।०१
३.	पिखुवा -तल्लोटोल सडक निर्माण	२	८,००,०००।-	७,८१,४७७।८८
४.	तेयुड माझगाउँ सडक निर्माण योजना	२	७,५०,०००.००।-	७,३१,०९३।००
५.	माझगाउँ डाडागाउँ सडक निर्माण योजना	२	७,००,०००।-	६,८५,२९४।१०
६.	पिखुवा टूसपुल निर्माण निर्माण योजना	२	७,५०,०००.००।-	७,३८,७३९।८२
७.	भिमसेन तिवा सडक निर्माण योजना	१	१००००००।-	९,७८,७९४।५४
८.	सेर्बोला दिक्वादेभान यांसिम्मा गोगने सडक निर्माण योजना	१	१००००००।-	९,७७,८२९,७७
९.	चित्रे पुनर्वासबाट बकाड जाने सडक निर्माण योजना	१	१००००००।-	९,४९,५६६।४३
१०.	सिम्लादक सडक टर्निङमा ग्याविन वाल निर्माण योजना	३	६,००,०००।-	५,९२,२३३।००
११.	कोल्बा देखि पावा सडक निर्माण योजना	३	५,००,०००।-	४,९५,९२०।५२
१२.	नागीटार लकुवा सडक निर्माण योजना	३	८,००,०००।-	७,८७,६३३।४१
१३.	बेन्धोड खेलमैदान निर्माण योजना	४	१००००००।-	७,३७,३८८।६४

उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न योजनाहरू

२०

सिसुवाखोला
वडा नं. १

४५

ताम्कु
वडा नं. ३

१७

याफु
वडा नं. ५

२५

बाला
वडा नं. २

२९

माङतेवा
वडा नं. ४

१३६

जम्मा
सबै वडा

संस्था समिति र अमानतबाट सम्पन्न योजनाहरू

संस्था समिति मार्फत


योजना	वडा	जम्मा रकम
कुखुरा फर्म प्रवर्द्धन	३	रु. १२००००
जिल्ला संघ/पत्रकार भवन	खाँदबारी	रु. १५००००
बाखा खोर निर्माण	३	रु. १५००००
अपांगता महासंघ भवन	खाँदबारी	रु. १०००००

अमानतबाट सञ्चालित

- एकलेखोला काठेपुल – रु. ५०००० (वडा ४)
- तिवा/नेवाटार/सर्बोला सडक सरसफाइ – रु. १,००,००० (वडा १)
- तिवाखोला काठेपुल – रु. ७०,००० (वडा १)
- बाला स्वास्थ्य चौकी – रु. १००००० (वडा २)
- माहेश्वरी मावि शौचालय बाटो – रु. १००००० (वडा ५)
- सिसुवाखोला स्वास्थ्य चौकी रंगरोगन – रु. ५०,०००
- सिसुवाखोला स्वास्थ्य चौकी खानेपानी – रु. ५०,०००

बजेट अनुसार योजनाको संख्या

श्रेणी

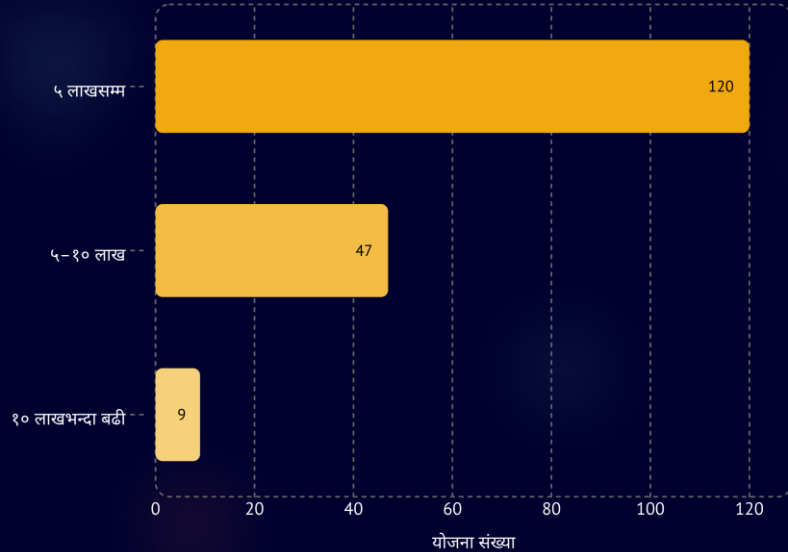

जम्मा १७६ योजना

धेरैजसो योजनाहरू ५ लाखसम्मको श्रेणीमा छन् (१२० वटा)। ५-१० लाखसम्म योजनाहरू ४७ र १० लाख भन्दा बढी योजनाहरू ९ वटा मात्र छन्।



कुल १७६ मध्ये ६८% योजनाहरू सानो बजेट (५ लाख कम) का छन्।

प्रमुख उपलब्धिहरू

- • स्वीकृत योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको ।
- • सडक, भवन तथा खानेपानी आयोजनाहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको ।
- • उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीसँग समन्वय गरी गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिइएको ।
- • नियमित प्राविधिक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरिएको ।
- • वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गरिएको ।

सम्झौता भएर कार्य नभएका योजनाहरू

योजनाको नाम	वडा	अध्यक्ष	मिति	विनियोजित बजेट
खड्गुवा-माहेश्वरी सडक	५	अर्जुन मेवाहाङ	२०८३-०२-१३	रु. १,००,०००
मुलगाउँ खानेपानी मर्मत	४	जनक राई	२०८२-१२-१२	रु. २,००,०००
नेवाखोला फलामे पुल	१	नरेश कुलुङ राई	२०८३-०२-०१	रु. ६,१६,३२७
देर्दी ताकुक्मा गोरेटो बाटो	१	आइत कुमार राई	२०८३-०१-०८	रु. २,५०,०००

यी ४ वटा योजनाहरूमा सम्झौता भए पनि कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन।

सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष र चुनौतीहरू

□ सकारात्मक पक्ष

- प्राविधिक जनशक्तिको स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड
- वडा तथा पालिकास्तरीय नियमित अनुगमन
- योजना सञ्चालनमा जनसहभागिता
- सबै वडामा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्था

□ □ नकारात्मक पक्ष

- वातावरणीय र मानवीय असर अध्ययन नगरिनु
- आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना बीच तालमेल नहुनु
- मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट बीच फरक
- योजना ढिलो सम्झौता भई सम्पन्न समयसिमा

❑ ❑ चुनौतीहरू

- कमजोर भूगोलका कारण दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा समस्या
- आवश्यकता र उपलब्ध स्रोत-साधन बीच फराकिलो खाडल
- निजी आवस निर्माण गर्न आवश्यक मापण्ड तयार गर्नुपर्ने
- स्टिमेट अनुसार बजेटको कमी
- निर्माण सामग्री ढुवानीमा महगीपनले गर्दा व्यवसायी मारमा पर्नु
- छरिएको बस्ती भएकोले समान रूपले विकास विस्तार गर्न नसक्नु
- आवश्यकता परीपूर्ति गर्न सिमीत बजेट

प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजनामा असर

दक्ष मिस्त्री/कामदार तथा जनशक्ती को अभाव

सुझाव

- आवास निर्माणअघि भू-गोल सुरक्षित छ कि छैन यकिन गर्नु
- पूर्णवाधार विकासअघि वातावरण, लाभ, लागत र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु
- पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु
- स्वरोजगार र रोजगार सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी योजना बनाउनु
- सम्झौता गरी उपभोक्ता समितिले काम नगरेमा उचित सम्मानको व्यवस्था गर्नु

१३) आगामी वर्षका प्राथमिकता

- ✓ • गुणस्तरीय तथा दिगो पूर्वाधार निर्माण
- ✓ • समयमै योजना सम्पन्न गर्ने
- ✓ • वातावरणमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिने
- ✓ • सूचना प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने
- ✓ • सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने

निष्कर्ष

- भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गर्दै गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ। आगामी वर्षमा पनि दिगो, सुरक्षित र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई जनमुखी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ।



केही योजनाको
तस्विरहरू



बखलटुम वेलिब्रिज





बुधबारे कृषि बजार व्यवस्थापन योजना





५ शैयाको ताम्कु प्राथमिक अस्पताल योजना







५ नं. वडा
कार्यालय
भवन
निर्माण
योजना





५ नं. वडा
कार्यालय
भवन
निर्माण
योजना





५ नं. वडा कार्यालय भवन



तेयुड माझगाउ सडक निर्माण योजना





प्रशासकीय भवन निर्माण योजना





सिम्लादक ग्याविन वाल निर्माण योजना





नागिटार देखि लकुवा जाने सडक निर्माण योजना





साम्तिङ खानेपानी निर्माण योजना





खेम्पालुङ गुफा संरक्षण तथा सरसफाई योजना



धन्यवाद !
